HARMONOGRAM HLUCHOV

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	Převzetí staveniště	1 den?	22.4. 24	22.4. 24	
2	**Zařízení staveniště**	**262 dny**	**22.4. 24**	**22.4. 25**	
3	provozování objektů ZS	262 dny	22.4. 24	22.4. 25	
4	odstranění objektů ZS	7 dny	14.4. 25	22.4. 25	
5	vybudování objektů ZS	7 dny	22.4. 24	30.4. 24	
6	**SPAŠKOVÁ KANALIZACE**	262 dny	22.4. 24	22.4. 25	
7	**SO 01.1 Kanalizace gravitační stoky**	**136 dny**	**22.4. 24**	**28.10. 24**	
8	**Stoka N**	**130 dny**	**24.4. 24**	**22.10. 24**	
9	stoka N ŠN 1-ŠN2 četa Staněk	4 dny	24.4. 24	29.4. 24	
10	stoka N Š BP - ŠN 1 četa Žák	4 dny	17.10. 24	22.10. 24	
11	**Stoka A ,A1, A2**	**130 dny**	**30.4. 24**	**28.10. 24**	
12	stoka A DN 250 Š1 -Š3 četa Staněk	11 dny	30.4. 24	14.5. 24	9
13	stoka A DN 250 Š 16 - Š17 četa Žák	11 dny	3.5. 24	17.5. 24	27
14	stoka A- 1 DN 250 Š9-Š44 četa Lorenc	30 dny	27.5. 24	5.7. 24	
15	stoka A DN 250 Š3 -Š10 četa Staněk	30 dny	15.5. 24	25.6. 24	12
16	stoka A DN 250 Š 10 - Š11 četa Žák	5 dny	20.5. 24	24.5. 24	13
17	stoka A DN 250 Š 11 - Š16 četa Žák	37 dny	6.9. 24	28.10. 24	22
18	stoka A-2 Š14- Š26	46 dny	6.8. 24	8.10. 24	
19	**Stoka B,B1,B2**	**103 dny**	**22.4. 24**	**11.9. 24**	
20	stoka B DN 250 Š2- Š33 četa Malý	12 dny	24.4. 24	9.5. 24	21
21	stoka B-1 DN 250 Š30-Š41 četa Malý	2 dny	22.4. 24	23.4. 24	
22	stoka B DN 250 Š33 - Š40 četa Malý	52 dny	20.5. 24	30.7. 24	
23	stoka B-1 DN 250 četa Lorenc	20 dny	8.7. 24	2.8. 24	
24	stoka B-2 Š35 - Š48 četa Malý	31 dny	31.7. 24	11.9. 24	22
25	**SO 01.1 Výtlaky**	**54 dny**	**22.4. 24**	**4.7. 24**	
26	Výtlak větev I četa Žák	12 dny	3.6. 24	18.6. 24	
27	Výtlak větev II četa Žák	9 dny	22.4. 24	2.5. 24	
28	Výtlak větev III. četa Žák	12 dny	19.6. 24	4.7. 24	26
29	**SO 1.2 Splaškové odbočky**	**136 dny?**	**22.4. 24**	**28.10. 24**	
30	stoka A	136 dny?	22.4. 24	28.10. 24	
31	stoka A1	30 dny	27.5. 24	5.7. 24	
32	stoka A2	20 dny	22.7. 24	16.8. 24	
33	stoka B	79 dny	22.4. 24	8.8. 24	
34	stoka B1	25 dny	8.7. 24	9.8. 24	31
35	stoka B2	32 dny	5.8. 24	17.9. 24	
36	výtlaky	81 dny	22.4. 24	12.8. 24	
37	**SO 3.1 ČOV stavební část a objekty v areálů ČOV**	**173 dny**	**27.5. 24**	**22.1. 25**	
38	zemní práce	6 dny	27.5. 24	3.6. 24	
39	monolitické práce	50 dny	4.6. 24	12.8. 24	38
40	zděné kce	12 dny	13.8. 24	28.8. 24	39
41	střešní konstrukce	15 dny	29.8. 24	18.9. 24	40
42	ostaní práce a konstrukce	90 dny	19.9. 24	22.1. 25	41
43	**SO 3.2 -3.8 ostatní stavební objekty na ČOV**	**96 dny**	**17.6. 24**	**28.10. 24**	
44	objekty ČOV	96 dny	17.6. 24	28.10. 24	
45	**SO 3.9 Příjezdová komunikace k ČOV**	**15 dny**	**20.5. 24**	**7.6. 24**	
46	zemní práce	3 dny	20.5. 24	22.5. 24	
47	podkladní vrstvy	7 dny	23.5. 24	31.5. 24	46
48	pokládka panelů	5 dny	3.6. 24	7.6. 24	47
49	**SO 1.4 Přípojka vody**	**23 dny?**	**27.5. 24**	**26.6. 24**	
50	zemní práce	14 dny	27.5. 24	13.6. 24	
51	pokládky potrubí	9 dny	14.6. 24	26.6. 24	50
52	protlak	6 dny	14.6. 24	21.6. 24	50
53	osazení vodoměrné šachty	1 den?	14.6. 24	14.6. 24	50
54	**SO 1-5 Oplocení ČOV**	**14 dny**	**25.10. 24**	**13.11. 24**	
55	práce na oplocení ČOV	14 dny	25.10. 24	13.11. 24	
56	**PS 2-1 Strojní technologie**	**144 dny**	**19.8. 24**	**6.3. 25**	
57	strojní technologie	95 dny	25.10. 24	6.3. 25	
58	**PS 2.2 Elektroinstalace**	**73 dny**	**19.8. 24**	**27.11. 24**	
59	2.1 Technologická elektroinstalace	21 dny	30.10. 24	27.11. 24	
60	2.2 Stavební elektroinstalace	18 dny	19.8. 24	11.9. 24	
61	**VON Vedlejší a ostatní náklady**	262 dny	22.4. 24	22.4. 25	

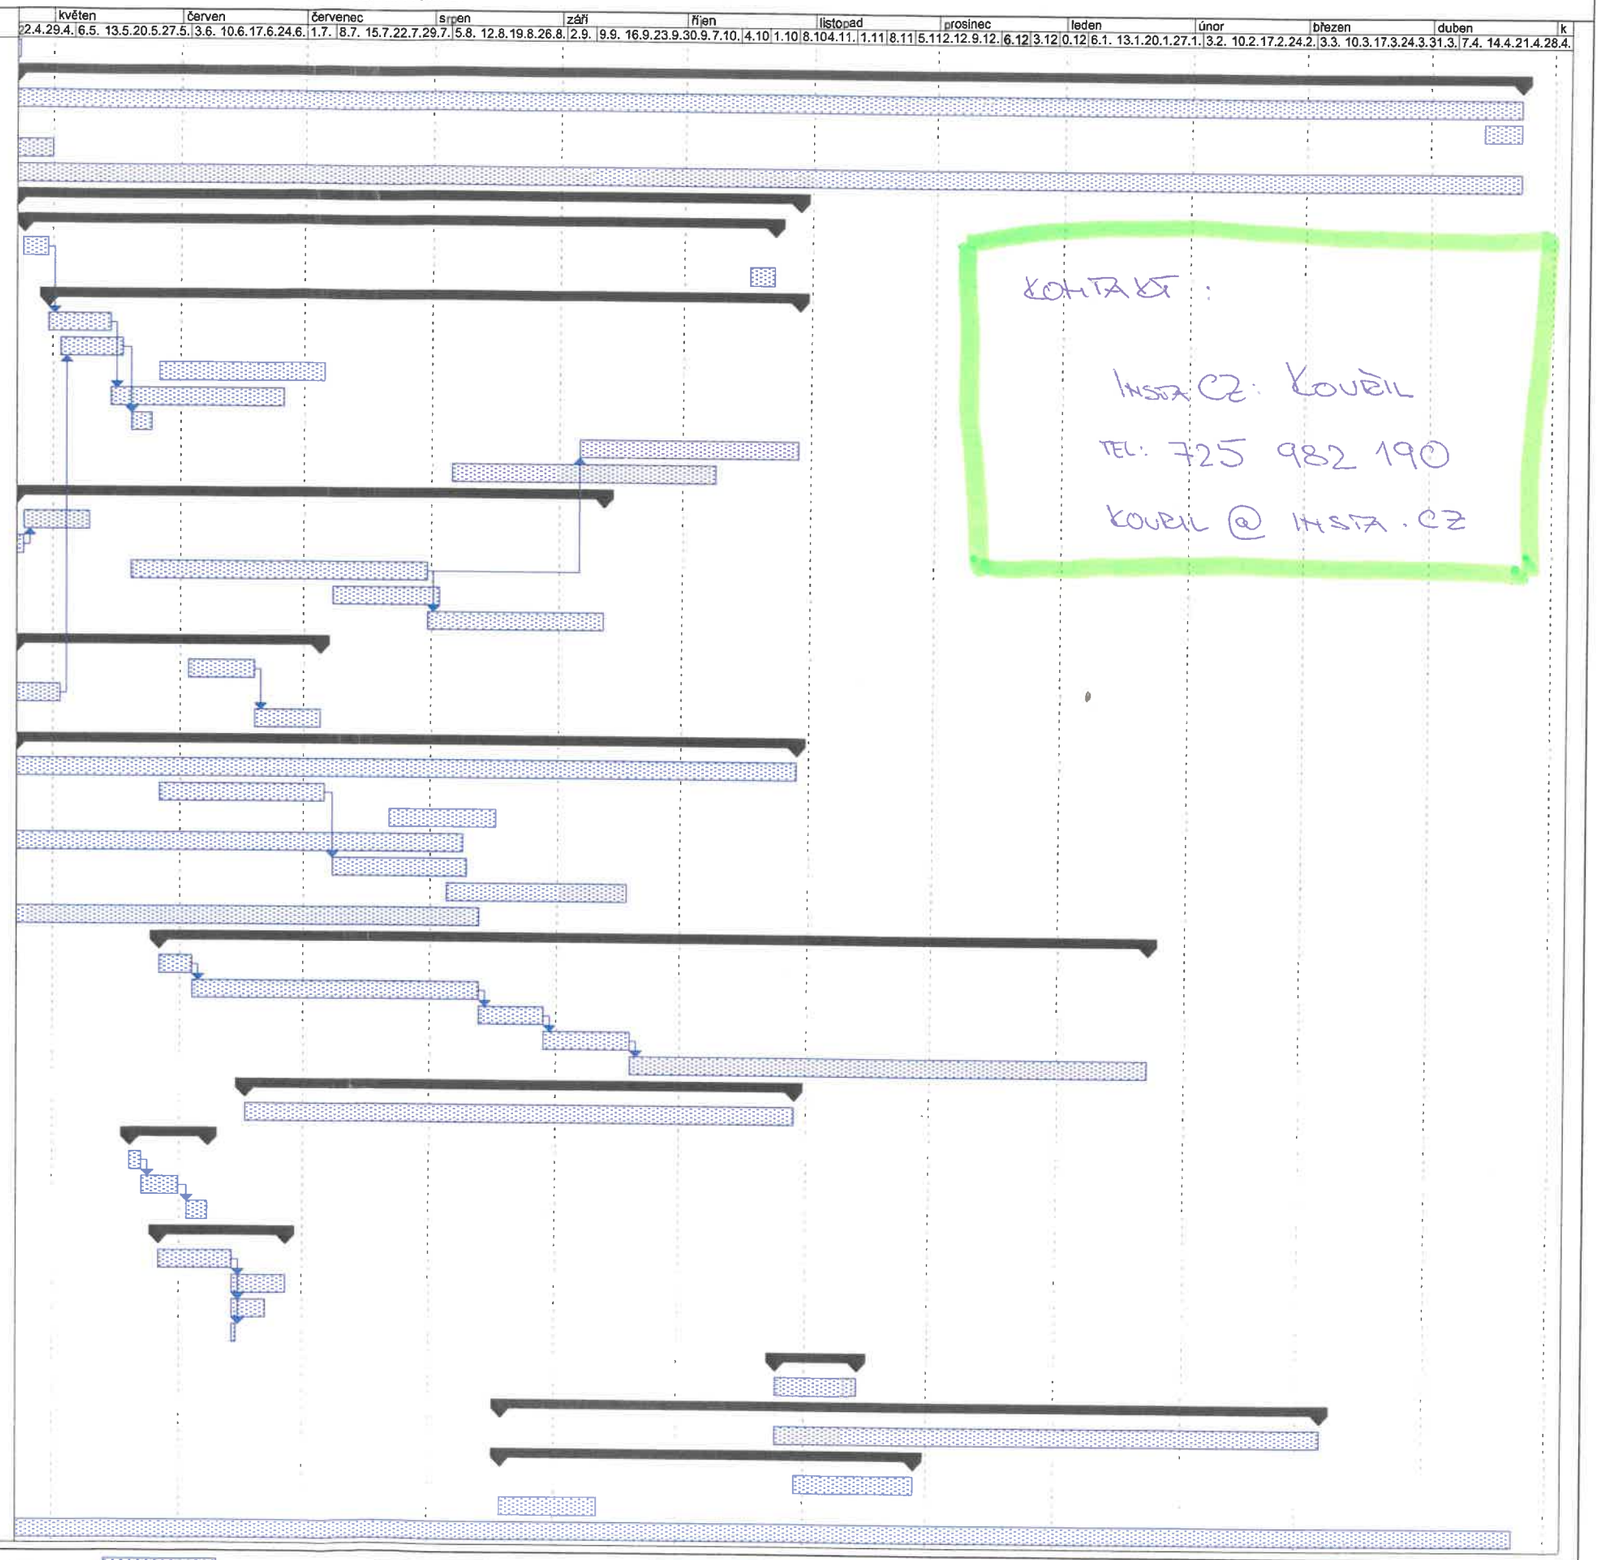

KONTAKT :

INSTA CZ: KOUBIL

TEL: 725 982 190

KOUBIL @ INSTA . CZ

Projekt: HMG kanalizace a ČOV H
Datum: 17.6. 08

Úkol | Milník | Zahrnutý úkol | Zahrnutý průběh | Vnější úkoly | Seskupit podle souhrnu
Průběh | Souhrnný | Zahrnutý milník | Rozdělení | Souhrn projektu | Konečný termín
